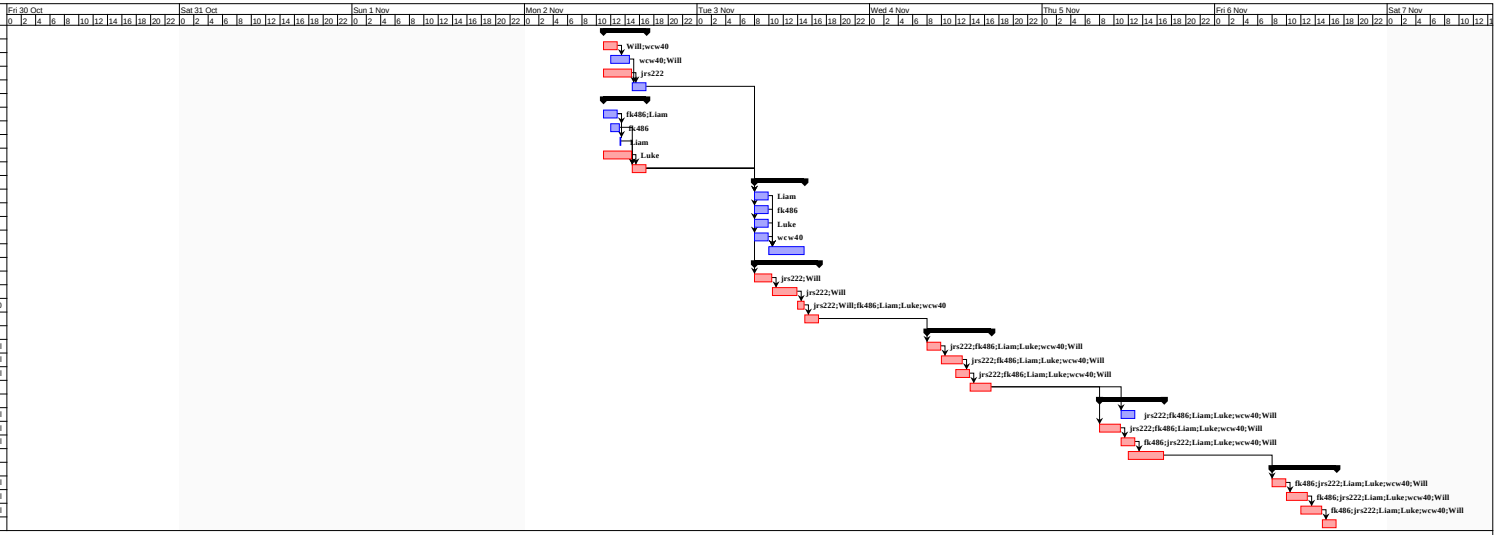	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	**WP1 - Project Management**	**0.625 days**	**02/11/2026, 11:00**	**02/11/2026, 17:00**		
2	Establish team charter	0.125 days	02/11/2026, 11:00	02/11/2026, 13:00		Will;wcw40
3	Delegate tasks	0.214 days	02/11/2026, 13:00	02/11/2026, 14:42	2	wcw40;Will
4	Create Ghant chart	0.375 days	02/11/2026, 11:00	02/11/2026, 15:00		jrs222
5	WP1 Buffer	0.25 days	02/11/2026, 15:00	02/11/2026, 17:00	3;4	
6	**WP2 - Quality Management System**	**0.625 days**	**02/11/2026, 11:00**	**02/11/2026, 17:00**		
7	Create a folder tree (ISO 9001 QMS)	0.125 days	02/11/2026, 11:00	02/11/2026, 13:00		fk486;Liam
8	Create file naming document	0.031 days	02/11/2026, 13:00	02/11/2026, 13:15	7	fk486
9	File location spreadsheet	0.031 days	02/11/2026, 13:15	02/11/2026, 13:30	7	Liam
10	Design and Development Matrix	0.375 days	02/11/2026, 11:00	02/11/2026, 15:00		Luke
11	Buffer WP2	0.25 days	02/11/2026, 15:00	02/11/2026, 17:00	10;9;8	
12	**WP3 - Transistor Research**	**0.75 days**	**03/11/2026, 08:00**	**03/11/2026, 15:00**		
13	Semiconductor Research	0.25 days	03/11/2026, 08:00	03/11/2026, 10:00	5;11	Liam
14	PN Junction Research	0.25 days	03/11/2026, 08:00	03/11/2026, 10:00	11	fk486
15	PNP vs NPN transistor research	0.25 days	03/11/2026, 08:00	03/11/2026, 10:00	11	Luke
16	MOSFET research	0.25 days	03/11/2026, 08:00	03/11/2026, 10:00	11	wcw40
17	Buffer WP3	0.5 days	03/11/2026, 10:00	03/11/2026, 15:00	16;15;13;14	
18	**WP4 - Transistor Investigation**	**1 day**	**03/11/2026, 08:00**	**03/11/2026, 17:00**		
19	Study BJT Input Characteristics	0.312 days	03/11/2026, 08:00	03/11/2026, 10:30	11	jrs222;Will
20	Study BJT Output Characteristics	0.312 days	03/11/2026, 10:30	03/11/2026, 14:00	19	jrs222;Will
21	MOSFET Output Characteristics	0.125 days	03/11/2026, 14:00	03/11/2026, 15:00	20	jrs222;Will;fk486;Liam;Luke;wcw40
22	Buffer WP4	0.25 days	03/11/2026, 15:00	03/11/2026, 17:00	21	
23	**WP5 - Logic Circuits**	**1 day**	**04/11/2026, 08:00**	**04/11/2026, 17:00**		
24	Build logic gates	0.25 days	04/11/2026, 08:00	04/11/2026, 10:00	22	jrs222;fk486;Liam;Luke;wcw40;Will
25	Build half-adder	0.25 days	04/11/2026, 10:00	04/11/2026, 13:00	24	jrs222;fk486;Liam;Luke;wcw40;Will
26	Assemble Full-Adder	0.125 days	04/11/2026, 13:00	04/11/2026, 14:00	25	jrs222;fk486;Liam;Luke;wcw40;Will
27	Buffer WP5	0.375 days	04/11/2026, 14:00	04/11/2026, 17:00	26	
28	**WP6 - Project Presentation**	**1 day**	**05/11/2026, 08:00**	**05/11/2026, 17:00**		
29	Audit	0.125 days	05/11/2026, 11:00	05/11/2026, 13:00	27	jrs222;fk486;Liam;Luke;wcw40;Will
30	Create Slideshow	0.375 days	05/11/2026, 08:00	05/11/2026, 11:00	27	jrs222;fk486;Liam;Luke;wcw40;Will
31	Record Slideshow	0.125 days	05/11/2026, 11:00	05/11/2026, 13:00	30	fk486;jrs222;Liam;Luke;wcw40;Will
32	Buffer WP6	0.5 days	05/11/2026, 13:00	05/11/2026, 17:00	31	
33	**WP7 - Skill write up**	**1 day**	**06/11/2026, 08:00**	**06/11/2026, 17:00**		
34	Finalise team skill documents	0.25 days	06/11/2026, 08:00	06/11/2026, 10:00	32	fk486;jrs222;Liam;Luke;wcw40;Will
35	Write up team skills	0.25 days	06/11/2026, 10:00	06/11/2026, 13:00	34	fk486;jrs222;Liam;Luke;wcw40;Will
36	Write up individual skills	0.25 days	06/11/2026, 13:00	06/11/2026, 15:00	35	fk486;jrs222;Liam;Luke;wcw40;Will
37	Buffer WP7	0.25 days	06/11/2026, 15:00	06/11/2026, 17:00	36
